ハイパー セル
Hyper Cell
NETIS HK-200013-A

施工報告書

公園緑地整備工事

愛知県　東三河建設事務所
　豊川市　御油町地内
公園緑地整備工事
A-3 調整池
材料:HyP05-100-34
特徴:施工面積が大きい
　充填材を 2 種類(砕石、発生土)
　使用した
　　曲線部施工が多い





・施工前の全景写真



・ハイフレーム敷設状況

※左写真中の黄線を境界にして
　下側は砕石、上側は発生土を充填した。
　上写真にはその境界線が見られるられる。




・ハイフレーム敷設状況、発生土充填状況①

GeoVector



ハイフレーム敷設状況、発生土充填状況②

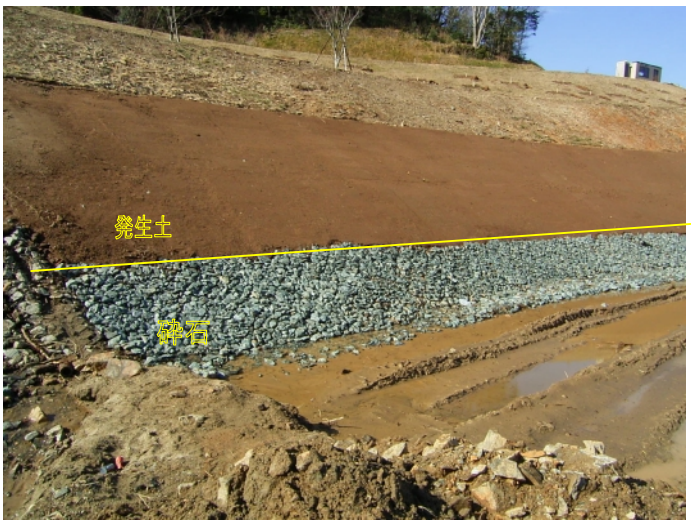

ハイフレーム敷設状況、発生土充填状況③



・施工完了写真①



・施工完了写真②

※本現場では曲線部施工が非常に多い
→ハイフレームの施工には問題ない

地山が岩である箇所がある
→あらかじめアンカーを打設する点を求め、
その位置に削岩機で穴を開けアンカーを打つ

GeoVector
